

ประเทศเมียนมา: โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง
(เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา

1. ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ:	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมา		
รหัสโครงการ:	MFA003/2020		
ประเทศ:	เมียนมา		
สาขา:	การพัฒนาพื้นที่และเมือง		
ปีอนุมัติ:	2563		
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ:	กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy: MOEE) และ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC)		
ขอบเขตโครงการ:	- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 3 แห่ง - ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงดัน ระยะทางประมาณ 52 กม. - ติดตั้งและปรับปรุงสายจำหน่ายแรงดัน ระยะทางประมาณ 91 กม. - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า		
วงเงินโครงการ (บาท):	รายการ	วงเงินอนุมัติ	วงเงินตามสัญญา
	- ค่าก่อสร้าง	1,339,817,011.00	1,339,817,011.00
	- ค่าบริการที่ปรึกษา	51,440,138.45	51,440,138.45
	- ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด	66,990,850.55	-
	รวม	1,458,248,000.00	1,391,257,149.45
เงื่อนไขทางการเงิน:	- อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.5 ต่อปี - อายุสัญญา 30 ปี (รวมระยะเวลาปลอดหนี้ 10 ปี) - ค่าธรรมเนียมบริหารของ สฟพ. ร้อยละ 0.15 ของวงเงินกู้ - วันชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 25 เมษายน และ 25 ตุลาคม - ผู้รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษา นิติบุคคลไทย - การใช้สินค้าและบริการจากไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - กฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายไทย		
ระยะเวลาก่อสร้าง:	ประมาณ 24 เดือน		

2. วัตถุประสงค์โครงการ/ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์:	ก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง
ผลประโยชน์:	- สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือนในเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเมียนมา - ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง - ลดอัตราการสูญเสียไฟฟ้าระหว่างการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า


3. วันที่สำคัญ

วันที่อนุมัติ FA:	14 กรกฎาคม 2563	วันที่ลงนามสัญญา:	23 กันยายน 2563
วันที่สัญญามีผลบังคับ:	23 กันยายน 2563	Restructuring (ถ้ามี):	-
วันที่สิ้นสุดเบิกจ่าย:	22 กันยายน 2568	Revised Closing (ถ้ามี):	-

4. ยอดการเบิกจ่าย ณ เดือนมีนาคม 2567

วงเงินกู้:	1,458,248,000.00 บาท	วงเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี):	-
วงเงินเบิกจ่ายสะสม:	-	การเบิกจ่าย ณ มี.ค. 67:	-
วงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย:	1,391,257,149.45 บาท	ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม:	-
สัดส่วนการใช้สินค้าและบริการจากไทยสะสม:	-	สัดส่วนการใช้สินค้าและบริการจากไทย:	-

ประมาณการเบิกจ่ายรายปี (ปีงบประมาณ)

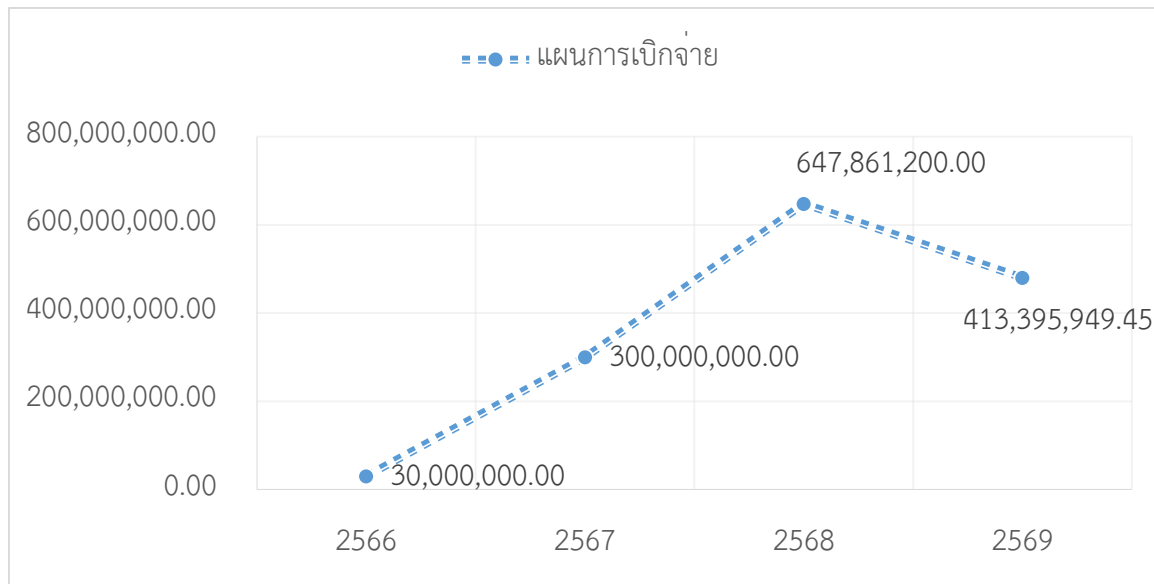


5. สถานะการดำเนินโครงการ ณ เดือน มี.ค. 2567

	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
งานบริการที่ปรึกษา:	อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยฝ่ายเมียนมา	-
- บริษัทที่ปรึกษา:	-	
- วันที่ลงนามสัญญา:	-	
- มูลค่างานตามสัญญา:	-	
- ระยะเวลาทำงาน:	-	
- ขยายระยะเวลาทำงาน (ถ้ามี):	-	
งานก่อสร้าง:	จะดำเนินการภายหลังจากดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ	-
- บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง:		
- วันที่ลงนามสัญญา:		
- มูลค่างานตามสัญญา:		
- ระยะเวลาการก่อสร้าง:		
- ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง (ถ้ามี):		
- การปรับเปลี่ยนงาน (VO) (ถ้ามี):		

6. สถานะการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม

ระยะ	เอกสารประกอบการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
ระยะก่อนก่อสร้าง	-	-
ระยะก่อสร้าง		
ระยะดำเนินการ (ก่อสร้างแล้วเสร็จ)		

7. แผนที่โครงการ

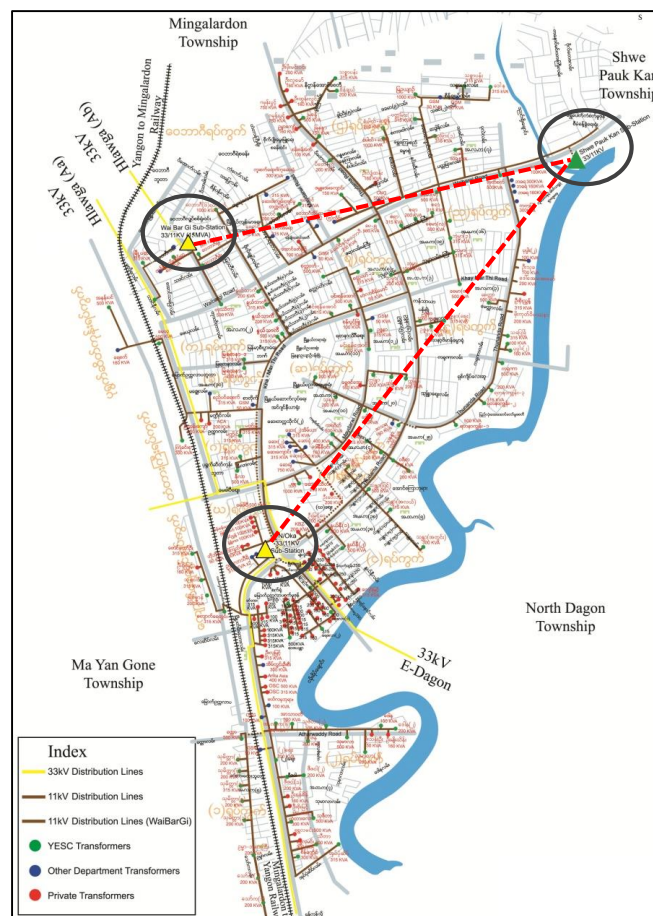

8. พื้นที่โครงการในปัจจุบัน



สถานีไฟฟ้าย่อย Wai Bar Gi



สถานีไฟฟ้าย่อย Shwe Pauk Kan



สถานีไฟฟ้าย่อย North Okkalapa



สายส่งไฟฟ้าในปัจจุบัน
